



муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад № 106»


Лин-проект  
«Оптимизация процесса подготовки  
к прогулке  
воспитанников младшего  
дошкольного возраста в осенне  
зимний период»

# Паспорт проекта

## «Оптимизация процесса подготовки к прогулке воспитанников младшего дошкольного возраста в осенне-зимний период»



Паспорт лин-проекта  
**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 106»**  
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)  
**«Оптимизация процесса подготовки к прогулке воспитанников младшего дошкольного возраста в осенне-зимний период»**  
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:  
Карпан Е.И., заведующий  
**МБ ДОУ «Детский сад № 106»**  
(ФИО, должность, руководитель документа лин-проекта)  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)

<p><b>Общие данные:</b>  <b>Заказчик:</b> заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 106» Карпан Евгения Ивановна  <b>Процесс:</b> одевание воспитанников младшего дошкольного возраста  <b>Границы процесса:</b> от начала оптимизации процесса информирования до выхода на новый уровень обмена рабочей информацией  <b>Руководитель лин-проекта:</b> заведующий, Карпан Е.И.  <b>Команда лин-проекта:</b> Тарасенко Е.С., старший воспитатель; Дорогайкина Д.Г., педагог-психолог; Скобелева Ж.Н., воспитатель; Яковлева К.А., воспитатель.</p> <p><b>Цели и эффекты:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Наименование цели, ед. изм.</th> <th style="text-align: center;">Текущий показатель</th> <th style="text-align: center;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Сокращение времени одевания, минуты</td> <td style="text-align: center;">37мин</td> <td style="text-align: center;">15 мин</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Эффекты:</b>            1. <u>Согласованность действий взрослых в процессе одевания</u></p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени одевания, минуты	37мин	15 мин	<p style="text-align: center;"><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Длительный процесс сбора воспитанников на прогулку.</li> <li>2. Несогласованность действий взрослых в процессе одевания.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Согласование паспорта лин-проекта – «11» января 2023г.</li> <li>2. Картирование текущего состояния (с «11» января 2023 г. по «13» января 2023 г.)</li> <li>3. Анализ проблем и потерь (с «16» января 2023 г. по «20» января 2023 г.)</li> <li>4. Составление карты целевого состояния (с «23» января 2023 г. по «27» января 2023 г.)</li> <li>5. Разработка плана мероприятий (с «30» января 2023 г. по «02» февраля 2023 г.)</li> <li>6. Защита плана мероприятий (с «06» февраля 2023 г. по «10» февраля 2023 г.)</li> <li>7. Внедрение улучшений (с «13» февраля 2023 г. по «12» мая 2023 г.)</li> <li>8. Мониторинг результатов (с «15» мая 2023г. по «26» мая 2023 г.)</li> <li>9. Закрытие лин-проекта (с «01» июня 2023 г. по «...» г.)</li> <li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01» июня 2023 г. по «30» июня 2023 г.)</li> </ol>
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение времени одевания, минуты	37мин	15 мин					

# Команда проекта



**Карцан Евгения Ивановна,  
заведующий – руководитель проекта**



**Тарасенко Евгения Сергеевна –  
старший воспитатель**



**Дорогайкина Лариса Геннадьевна –  
педагог-психолог**




**Баранова Людмила Юрьевна  
– учитель-логопед**



**Волкова Надежда Николаевна -  
делопроизводитель**




# Карта текущего состояния процесса




1. Не согласованность действий взрослых
2. Маленькая площадь приемной
3. Недостаточное количество взрослых, оказывающих помощь при одевании детей
4. Большое количество воспитанников
5. Отсутствие визуализации и стандартизации ежедневных операций
6. Отсутствие навыков одевания у детей

# АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ (диаграмма Исикавы)

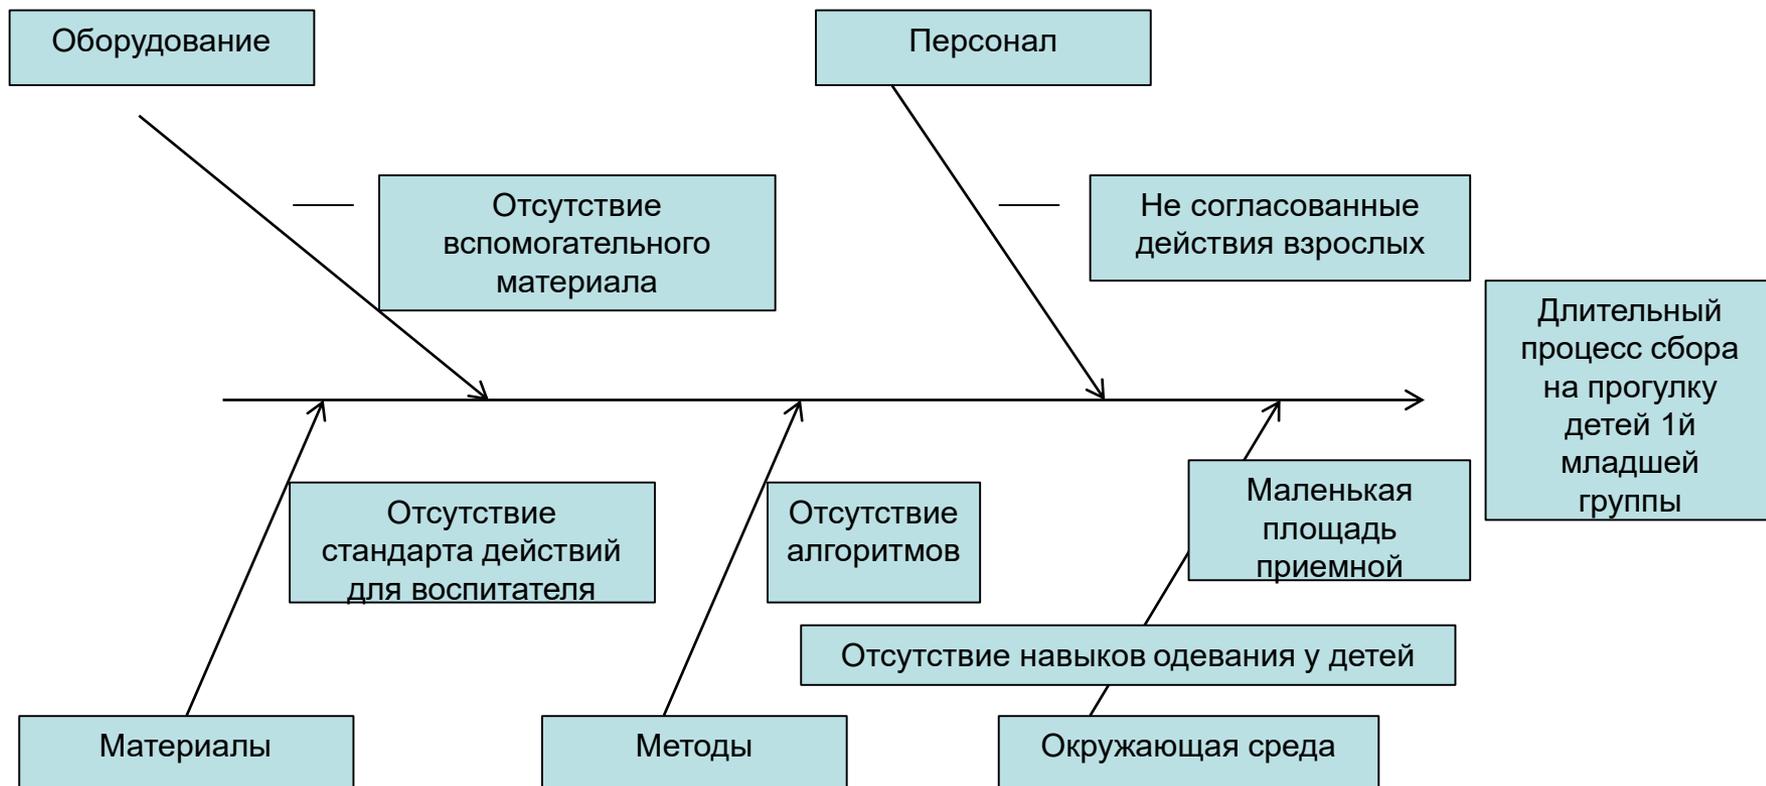


# Пирамида проблем

1. Не согласованность действий взрослых
2. Площадь приемной
3. Нехватка помощников
4. Большое количество воспитанников
5. Отсутствие визуализации и стандартизации ежедневных операций
6. Отсутствие навыков одевания у детей

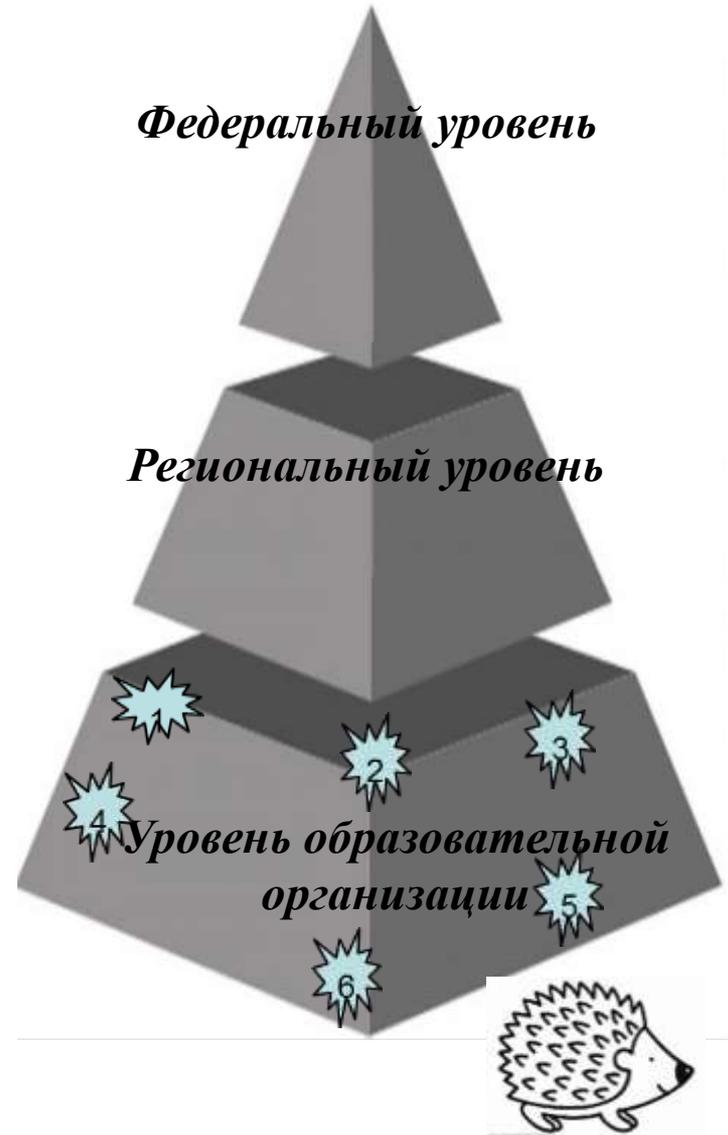

# Карта целевого состояния процесса



1. Не согласованность действий взрослых → Воспитатель, младший воспитатель действуют по одному алгоритму
2. Маленькая площадь приемной → Дети раздеваются и частично одеваются в группе
3. Недостаточное количество взрослых, оказывающих помощь при одевании детей → Закрепить за группой помощников из числа сотрудников ДОУ
4. Большое количество воспитанников
5. Отсутствие визуализации и стандартизации ежедневных операций → Разработать стандарт действий для воспитателей, алгоритм одевания для детей и памятки для родителей
6. Отсутствие навыков одевания у детей → Создать карточку игр и мобильные тренажеры для отработки навыка одевания

# Мероприятия

- При подготовке к прогулке расставлять стулья более рационально
- Создать картотеку игр
- Приобрести дидактическую куклу
- Изготовить мобильные тренажеры для отработки навыков одевания
- Изготовить алгоритм одевания одежды в детском саду
- Изготовить памятку для родителей «Порядок в кабинке»
- Создать стандарт действий воспитателя «Собираемся на прогулку»

БЫЛО



СТАЛО



БЫЛО



СТАЛО



# Достигнутые результаты

Цель	Текущий показатель	Целевой показатель	Полученный показатель
Сокращение времени одевания детей первой младшей группы на прогулку	37 мин	Сокращение времени протекания процесса в 2,4 раза	Сокращено время одевания детей Комфортное профессиональное взаимодействие сотрудников

